



 **vestregionen**
Klimaprojektet



Prosjektplan



Innhold

1. Formål	3
2. Prosjektplanens mål og hensikt	3
3. Gjennomføring av klimaprojektet.....	4
4. Mandat.....	4
5. Kommunikasjon	6
6. Prosjektorganisasjon.....	7



1. Formål

Vestregionen har som målsetning at ”Vestregionen skal ha og ta en ledende nasjonal rolle i arbeidet med klima- og energispørsmål”

På bakgrunn av dette har Vestregion iverksatt sin klimasatsing og har vedtatt 7 innsatsområder:

1. Energireduksjon i kommunale bygg
2. Verktøy/metode – utarbeide felles struktur på klimarapportering
3. Miljøsertifisering av kommunale bygg og virksomheter
4. Holdningskapende virksomhet, arbeid, atferd og motivasjon
5. Påvirke og målrette ønsket utbyggingsmønster ut fra vedtatte knutepunktstrategier
6. Samarbeid med næringsliv, kunnskapsinstitusjoner og forskning
7. Påvirke og bearbeide statlig lov- og regelverk

2. Prosjektplanens mål og hensikt

Prosjektplanen er den overordnede plan for hvordan klimaprojektet i Vestregionen skal organiseres og styres. Prosjektplanen skal løpende evalueres og videreutvikles/ revideres ved behov. Evaluering vil skje hvert halvår, eller oftere ved behov.

Målet med prosjektplanene er å:

Klargjøre organisasjon, ansvarsforhold, arbeidsrammer og intensjoner om prosesser slik at vi kan gjøres i stand til å oppfylle Vestregionens målsetninger og strategier slik at *”Vestregionen skal være en attraktiv, bærekraftig og dynamisk kunnskaps-, kompetanse- og verdiskapningsregion i Norge og Europa”*

Prosjektplanen og den løpende evalueringen av denne skal bidra til:

- Rask og entydig implementering av klimaprojektet til alle kommunene
- Forventningsavklaring i forhold til resultater, rammer, arbeidsform, styring, kommunikasjon og rapportering i prosjektet
- Overordnede føringer om prosesser og proaktiv styring
- Bevissthet omkring behov for ressurstilgang, kapasitet og kompetanse i prosjektet
- Evaluering av arbeidsform i prosjektet – for videreutvikling og løpende forbedring av arbeidet.



3. Gjennomføring av klimaprojektet

Prosjektet gjennomføres i to faser.

Fase 1

Det er etablert arbeidsgruppe med tilhørende nettverksgruppe for områdene ”Energi i bygg”, ”Verktøy og Metode” og ”Miljøsertifisering”.

Fase 2

I fase 2 vil Klimaprojektet arbeide med holdningsskapende virksomhet, samarbeid med næringsliv og forskning og myndigheter.

Transport og knutepunktstrategier følges opp utenfor dette prosjektet jf. tidligere vedtatte areal- og transportstrategi (Balansert utvikling)..

4. Mandat

Prosjektnavn	Klimasatsing i Vestregionen
Prosjekteier	Rådmannsgruppen
Andre	Ordførergruppen
Daglig leder i VR	Hans Hagene
Styringsgruppe	Svein V. Thorgersen, Svelvik, Ragnar Sand Fuglum Asker, Stig Hvoslef, Akershus Fk, Hans Hagene, Vestregionen Mandat for styringsgruppen:
Prosjektleder	Unni Larsen
Arbeidsgrupper	Det er etablert 3 arbeidsgrupper: <ul style="list-style-type: none">- Energi i bygg- Metoder/Verktøy- Miljøsertifisering Arbeidsgruppen skal være en drivkraft og pådriver for å initiere, tilrettelegge og bistå kommunene i Vestregionens klimasatsning. Arbeidsgruppen skal være et diskusjonsforum for temaer og



	<p>utfordringer knyttet hvordan oppnå de energi- og klimamål som er vedtatt i Vestregionen.</p> <p>Arbeidsgruppene skal:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ha ansvar for å samle inn reell informasjon fra alle kommuner, samt koordinere og informere om resultater• Konkretisere og realitetsbehandle Vestregionens vedtatte mål.• Utarbeide et sett med rammebetingelser og forslag til mål for Vestregionen.• Utarbeide og følge overordnet fremdriftsplan og delmål ut prosjektperioden.• Sikre økt kompetanse i kommunene og sørge for at Vestregionens mål integreres og følges opp i kommunene. <p>Rammebetingelser, avgrensinger og resultatet skal koordineres mellom de tre arbeidsgruppene. Nettverksgruppene skal fungere som et av virkemidlene til arbeidsgruppene.</p> <p>Arbeidsgruppen skal være sammensatt av personer med høy fagkompetanse, beslutningstakere og personer med konkrete utfordringer innen fagområdet.</p>
Nettverksgrupper	<p>Det etableres 3 nettverksgrupper. En i tilknytning til hver arbeidsgruppe.</p> <p>Nettverksgruppen skal være en pådriver og drivkraft for at Vestregionens målsetninger blir kjent, implementert og gjennomført i kommunene. Nettverksgruppen skal bistå arbeidsgruppen med å oppnå de energi- og klimamål som er vedtatt i Vestregionen</p> <p>Nettverksgruppen skal:</p> <ul style="list-style-type: none">• Informere og sikre at arbeidet med Vestregionens energi- og klimamål blir integrert i sin egen kommune• Synliggjøre erfaringer, positive tiltak og utfordringer• Være et diskusjonsforum for temaer og utfordringer knyttet til Vestregionens klimasatsning <p>Nettverksgruppen skal bestå av representanter fra alle kommuner. Representantene skal sørge for at det blir igangsatt prosesser i egen kommune.</p>
Resultatmål og leveranser	<p>Prosjektet skal realitetsbehandle og gjennomføre følgende fastsatte mål:</p> <p>Område 1: Energireduksjon i kommunale bygg</p> <ul style="list-style-type: none">• Redusere energibruk i eksisterende bygg med 15 % (2008-2010)• 50 % av alle nybygg skal være lavenergibygg i løpet av 3 år• Referansebygg – passivhus i alle kommuner.



- I regionen skal det oppføres 3-4 referansebygg i perioden

Område 2: Verktøy og metode

Med utgangspunkt i tilsvarende arbeid i Framtidens byer skal arbeidsgruppen:

- Sette konkrete mål på utvalgte områder
- Lage og ta i bruk likeartede måleindikatorer
- Utarbeide felles rapporteringsopplegg/-system

Område 3: Miljøsertifisering (virksomheter)

- Tre ulike modeller for miljøsertifisering skal vurderes
- Utrede ressursbruk og konsekvenser og investeringer
- Hvilke bygg skal sertifiseres
- Tidshorisont

Kommentar:

Miljøsertifisering av kommunal bygningsmasse flyttes til Område 1 på grunn av EUs kommende bygningsenergidirektiv.

5. Kommunikasjon

Kommunikasjonsplan


Daglig leder i Vestregionen har hovedansvar for håndtering av media, utvikling av web-sider, kommunikasjon, informasjon etc. Prosjektansvarlig skal bidra med informasjon til web-sider for klimaprojektet



6. Prosjektorganisasjon

Organisasjonsmodell – Klimaprojektet

Oppdatert 8.3.2010

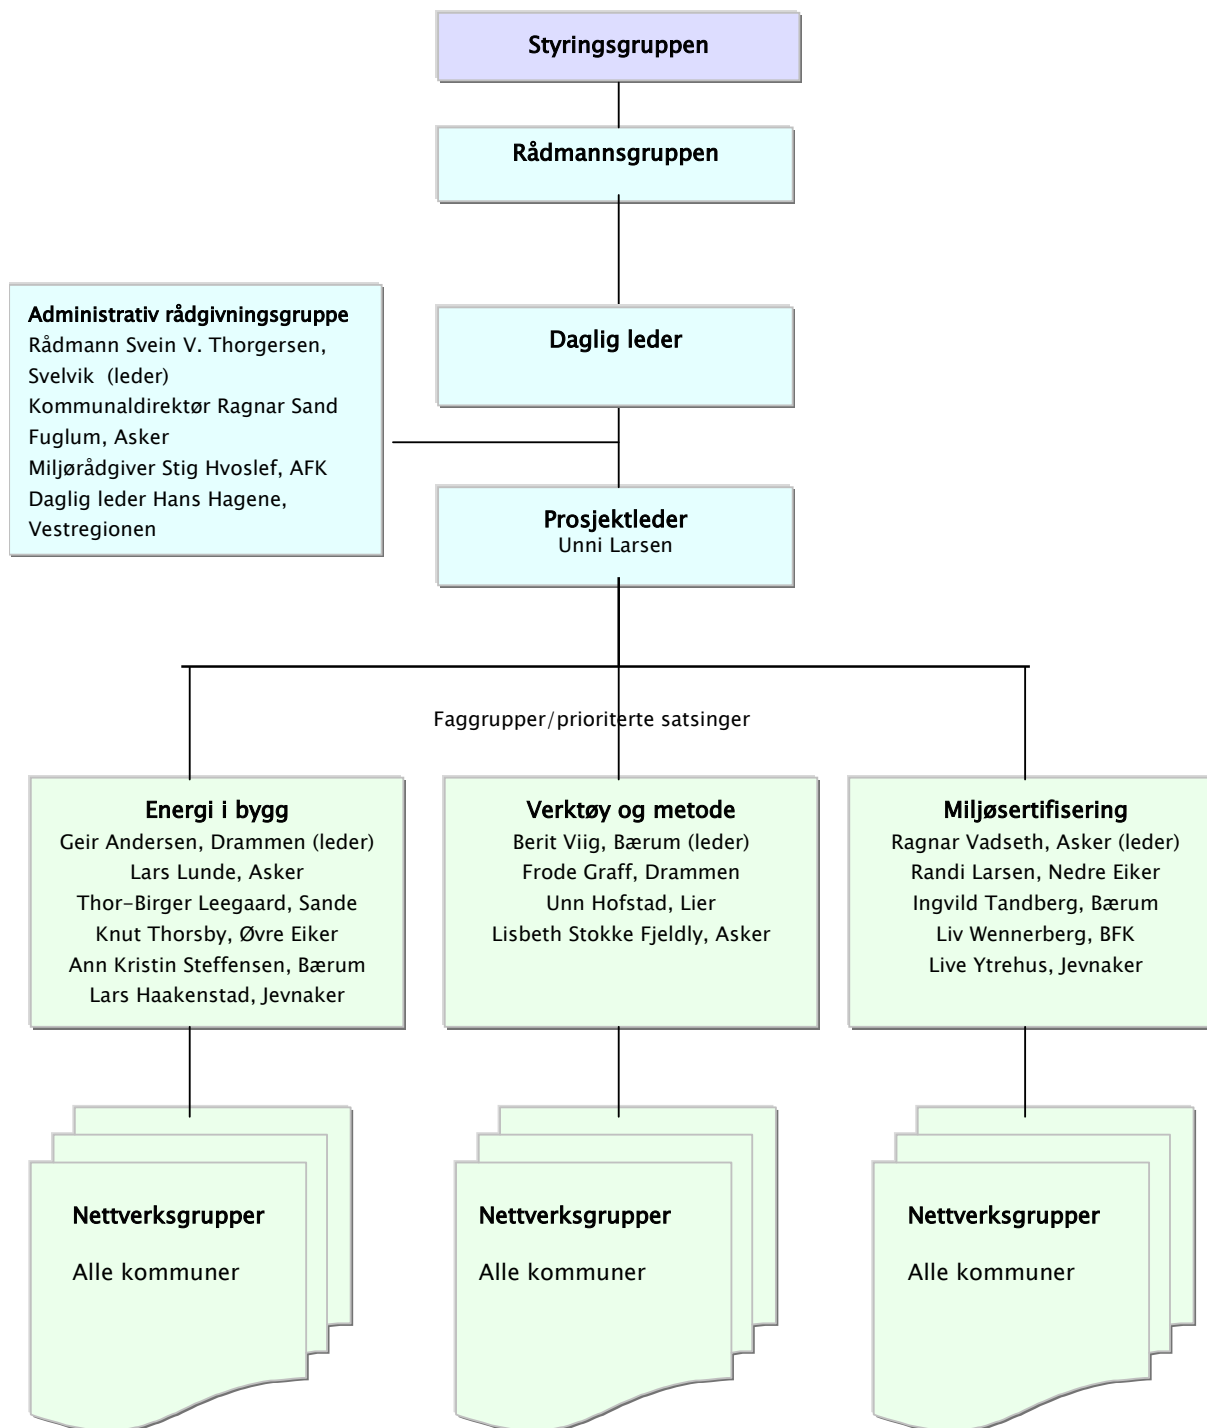



Deltakere i Klimaprojektet

Energi i bygg	Miljøsertifisering	Verktøy og Metode
Jan Sigurd Pettersen, Afk Lars Lunde, Asker Anders Fossum (uavklart), Bfk Inger-Marie Nygård, Bærum Geir Andersen, Drammen Steinar Langvandsbråthen, Hole Steinar Østli Andreassen, Hurum Emil Hovde, Lier Bjørn Diseth, Nedre Eiker Arild Hungerholdt, Ringerike Arild Dorholdt, Røyken eiendom Thor Birger Leegaard, Sande Roar Strøm, Svelvik Knut Thorsby, Øvre Eiker Lars Haakenstd, Jevnaker Solveig Klevstad, Modum Tor Kolstad, Sigdal Knut Grimnes, Krødsherad	Daniel Molin, Afk Ragnar Vadseth, Asker Liv Wennerberg, Bfk Ingvild Tandberg, Bærum Hege B Andersen, Drammen Hans Tollef Solberg, Hole Steinar Østli Andreassen, Hurum Unn Hofstad, Lier Randi Larsen, Nedre Eiker Grethe Tollefsen, Ringerike Ikke avklart, Røyken Randi Aune Steinacher, Sande Tor Reiерth, Svelvik Tore Lagesen, Øvre Eiker Live Ytrehus, Jevnaker Morten Eken, Modum Hans Ole Wærsted, Sigdal Erik Bjore, Krødsherad	Stig Hvoslef, Afk Sven Bjørnson, Asker Tom Christensen, Bfk Berit Viig, Bærum Frode Graff, Drammen Hans Tollef Solberg, Hole Unn Hofstad, Lier Rune Bratlie, Nedre Eiker Grethe Tollefsen, Ringerike Tor Aslaksen Simonsen, Røyken Thor Birger Leegaard, Sande Tor Reiерth, Svelvik Tore Lagesen, Øvre Eiker Steinar Østli Andreassen, Hurum Asbjørn Moen, Jevnaker Morten Eken, Modum Hans Ole Wærsted, Sigdal Erik Bjore, Krødsherad
